



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
DILOG/GERÊNCIA DE INSTALAÇÕES
RESUMO - BOLETIM DA 5ª MEDIÇÃO

1 - Dados do Contrato:

Objeto do Contrato: **CONSTRUÇÃO DE ESCADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA NO FÓRUM CRIMINAL**
Órgão Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE - TJAC**
Construtora: **VS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO IMP. E EXP.**
Fonte de Recurso: **FUNSEG**
Nº contrato: **10/2020**
Fiscal da obra: **ENG MARCUS ALEXANDRE**
Resp. Técnico Emp.: **ENG LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA**

2 - Temporalidade da Medição:

Número da medição: **5ª**
Data da medição: **28/09/2020**
Período da medição: **10/07/20 a 14/08/20**
Início da obra: **17/02/20**
Prazo Inicial da Obra: **2 meses**
Prazo Reprogramado: **1º Termo Aditivo - 180 dias**
Prazo Decorrido: **180 dias**
Término da Obra: **14/08/2020***
Situação da Obra: **Concluída**

3 - Resumo da Medição:

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)			
		CONTRATADO+ADEQ	NO PERÍODO	ACUMULADO	%
1	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	82.034,76	5.128,38	81.926,49	99,9%
2	ESTRUTURAS EM CONCRETO	15.059,27	-	15.059,27	100,0%
3	ESTRUTURAS METÁLICAS	190.523,45	23.473,30	190.523,45	100,0%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	25.891,68	25.891,68	25.891,68	100,0%
TOTAL		313.509,16	54.493,36	313.400,89	99,97%

Valor da presente medição : **54.493,36** (quarenta e três mil, trezentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos)

4 - Situação da obra:

Execução física: **99,97%**
Situação do Cronograma Inicial:
Valor contrato inicial: **290.000,93**
Valor 1ª Adequação: **313.509,16**

Nível Técnico da Empresa				Conceito da Empresa			
<input type="checkbox"/> 0,00 a 4,99	<input type="checkbox"/> 5,00 a 6,99	<input checked="" type="checkbox"/> 7,00 a 8,99	<input type="checkbox"/> 9,00 a 10,00	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Razoável	<input checked="" type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Muito boa

Observações:

Atestamos que os serviços constantes da presente medição foram executados de acordo com as especificações, estando todos os valores e quantitativos corretos.

* Encontra-se aprovada a prorrogação do prazo de execução (processo SEI 0004826-07.2019.8.01.0000) por 120 dias conforme 1º Termo Aditivo.

5 - Documentos anexos:

- 1 - Boletim de Medição;
- 2 - Relatório Fotográfico.

Rio Branco - AC, 28 de setembro de 2020.

**Engº Civil Marcus Alexandre
Geins/Dilog**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GERÊNCIA DE INSTALAÇÕES-GEINS/DILOG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

5a Medição

CONTRATO:

10/2020

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE ESCADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA NO FÓRUM CRIMINAL

DATA:

28/09/2020



Foto 1 - Pintura de proteção - galvite e zarcão.



Foto 2 - Pintura de proteção - galvite e zarcão.

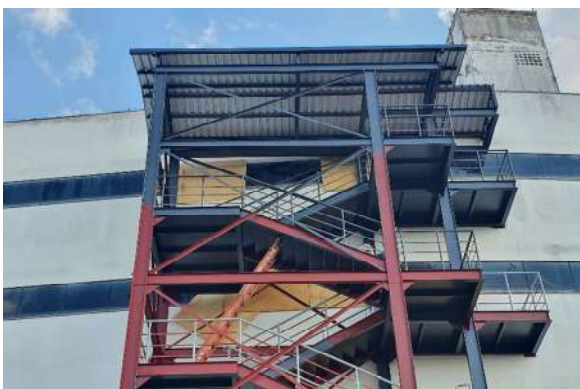


Foto 3 - Pintura geral da escada com esmalte sintético.



Foto 4 - Pintura sob os degraus da escada.



Foto 5 - Pintura dos patamares, degraus e guarda corpo da escada.



Foto 6 - Detalhes na pintura do guarda corpo.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

5a Medição

CONTRATO: 10/2020	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA NO FÓRUM CRIMINAL	DATA: 28/09/2020
--------------------------	---	-------------------------



Foto 7 - Remoção das janelas de vidro, para abertura do vão da porta corta fogo.



Foto 8 - demolição de parede de alvenaria para abertura do vão da porta corta fogo.



Foto 9 - Instalação dos batentes das portas corta fogo.



Foto 10 - Instalação das bandeiras.



Foto 11 - Instalação das soleiras das portas.



Foto 12 - Instalação das portas corta fogo, com barra antipânico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GERÊNCIA DE INSTALAÇÕES-GEINS/DILOG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

5a Medição

CONTRATO:

10/2020

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE ESCADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA NO FÓRUM CRIMINAL

DATA:

28/09/2020



Foto 13 - Parte externa da porta corta fogo.



Foto 14 - Abertura de vão na parede de gesso.



Foto 15 - Instalação dos condutores das instalações elétricas.



Foto 16 - Instalação dos sensores, luminárias e luminárias de emergência.



Foto 17 - Recolocação dos rodapés removidos.



Foto 18 - Fechamento de aberturas com divisória em drywall.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GERÊNCIA DE INSTALAÇÕES-GEINS/DILOG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

5a Medição

CONTRATO:	OBJETO:	DATA:
10/2020	CONSTRUÇÃO DE ESCADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA NO FÓRUM CRIMINAL	28/09/2020



Foto 19 - Fechamento das aberturas com drywall e instalação dos batentes das portas do corredor de



Foto 20 - Aplicação de galvite nas portas corta fogo.



Foto 21 - Lixamento das paredes em drywall.



Foto 22 - Pintura das paredes externas.



Foto 23 - Emassamento dos cantos do vão aberto para assentamento das portas corta fogo.

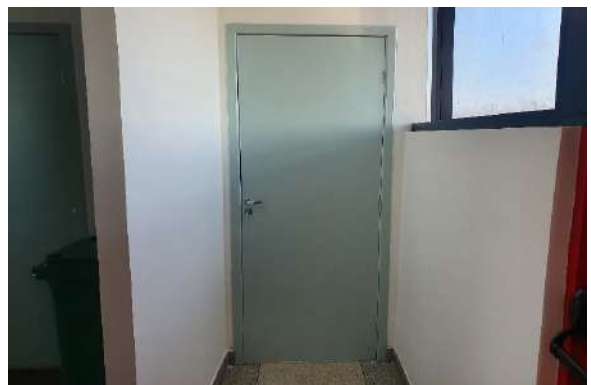


Foto 24 - Portas de acesso interno ao corredor pintadas e instaladas.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

5a Medição

CONTRATO:

10/2020

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE ESCADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA NO FÓRUM CRIMINAL

DATA:

28/09/2020



Foto 25 - Pintura geral, inst. elétricas e calçada de acesso concluídas.



Foto 26 - Portas corta fogo com sinalização e iluminação de emergência - acesso interno.

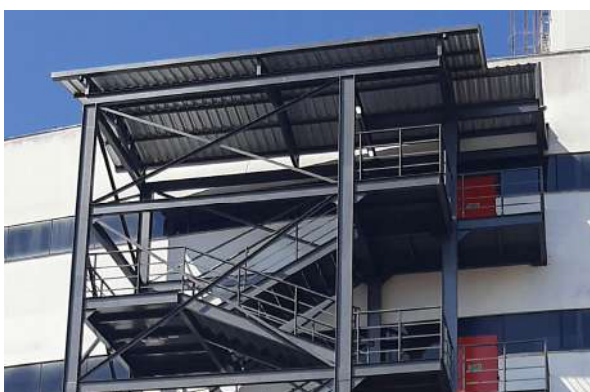


Foto 27 - Obra concluída.



Foto 28 - Obra concluída.
